

Hệ thống thông tin quản lý và Giám sát đánh giá


HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG KỸ THUẬT
Trà Vinh, 01-05/9/2014


MIS là gì?

- Hệ thống những dữ liệu được xử lý và sẵn sàng phục vụ công tác quản lý của dự án;
- bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác cho quá trình ra quyết định

Chức năng MIS:

- bảo đảm chức năng M&E, báo cáo và quản lý tri thức
- cung cấp một hệ thống tổng hợp bao gồm thu thập, phân tích và trao đổi thông tin
- giúp lưu trữ hồ sơ, tài liệu với mục tiêu chính là nhằm thông tin các quyết định quản lý dự án

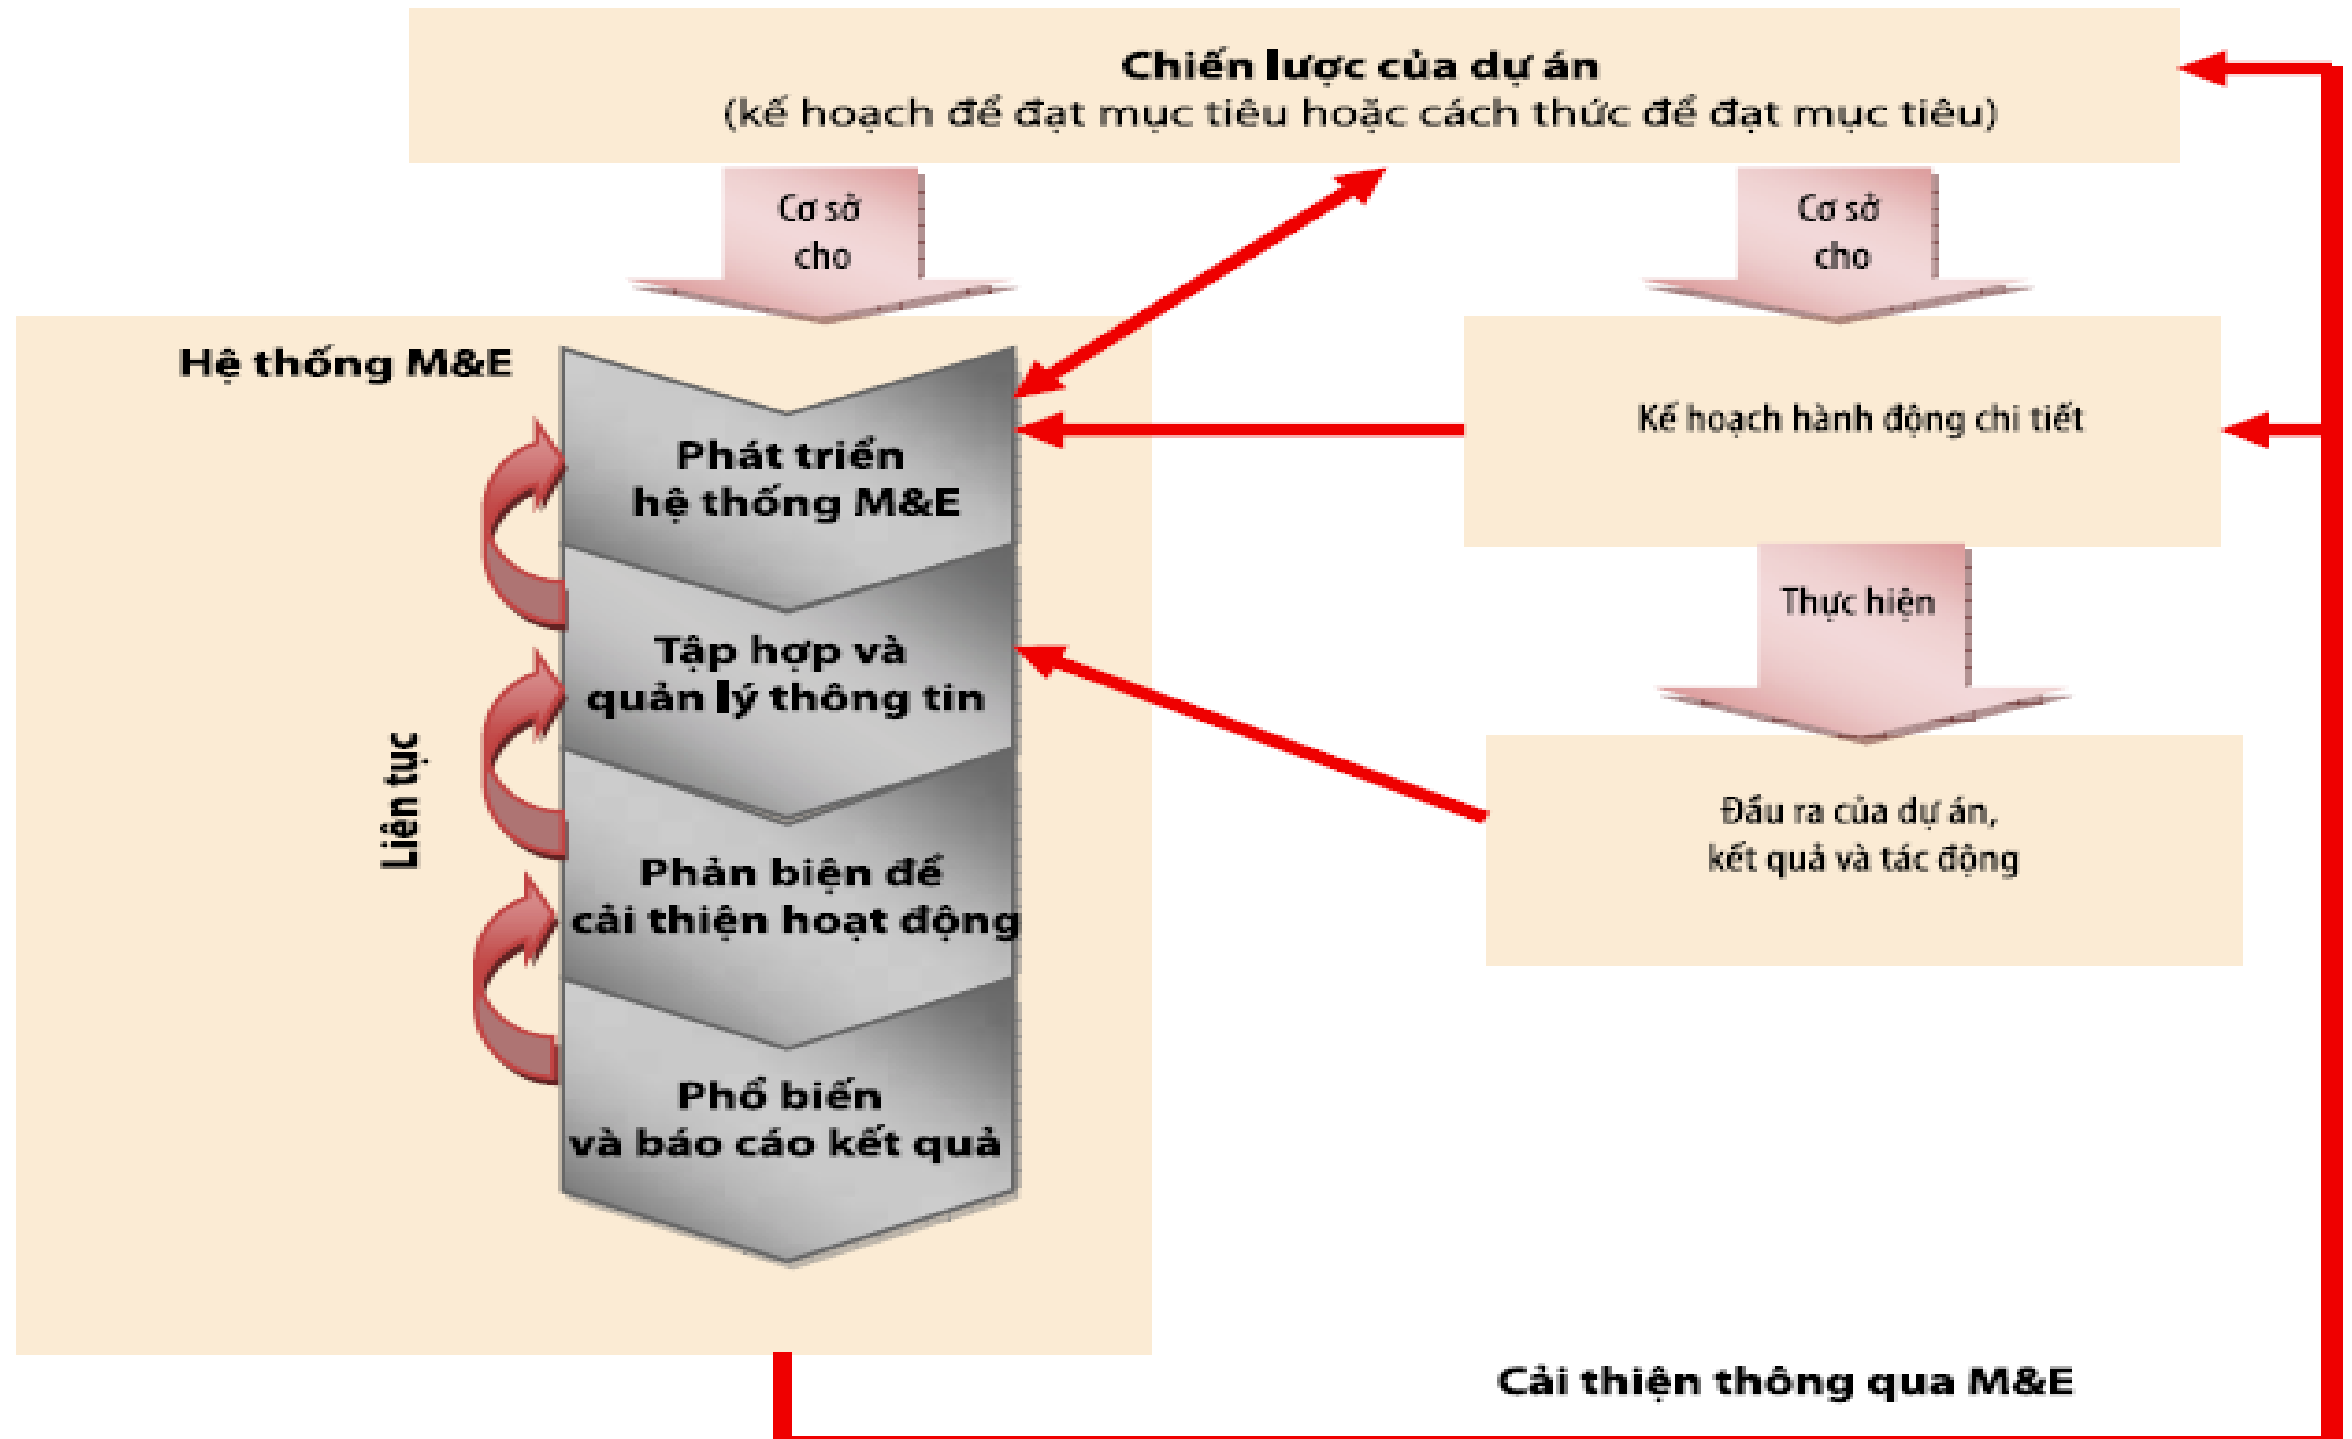

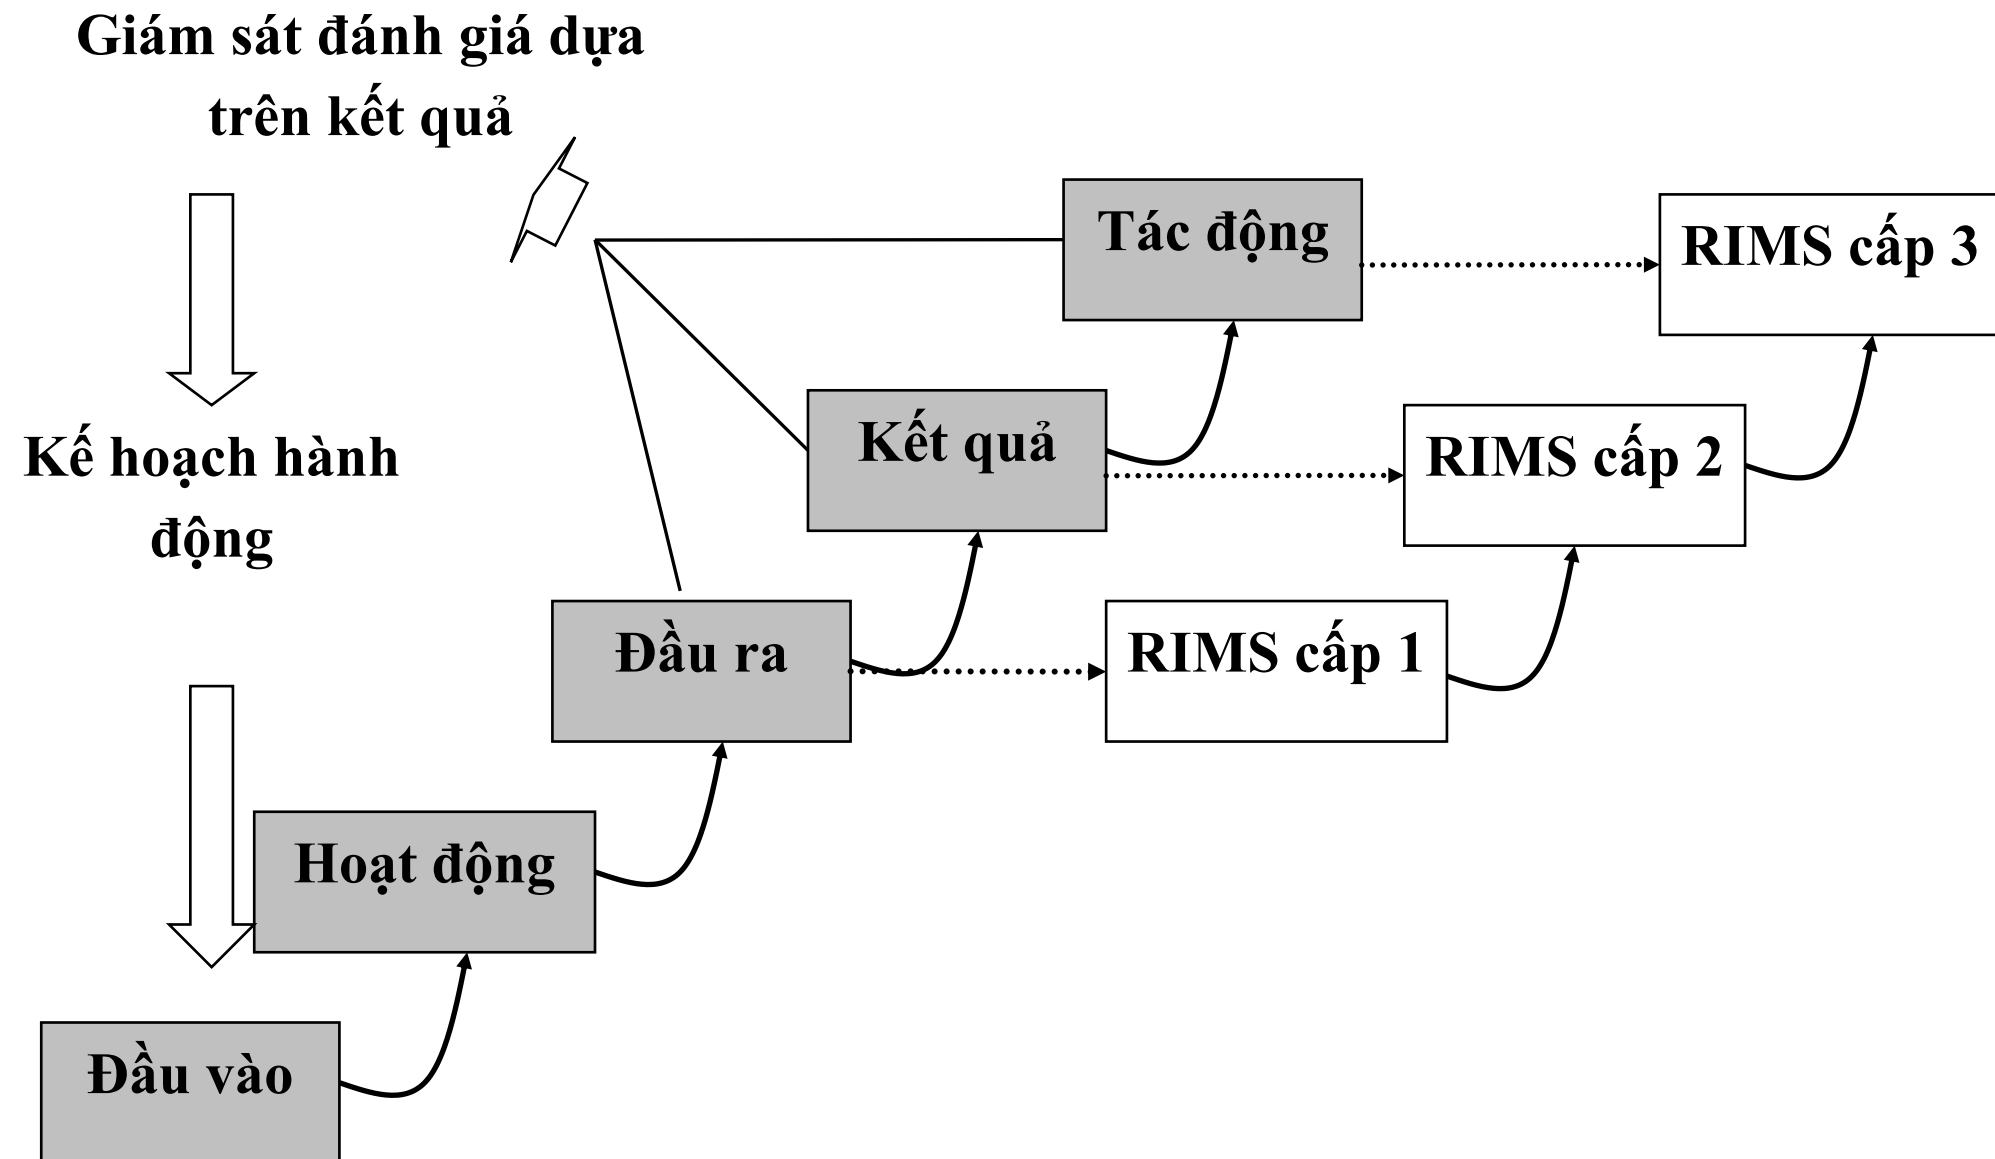

M&E nội bộ:

- PCU tự theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện, kết quả và tác động của Dự án
- thực hiện liên tục trong năm để thu thập thông tin, theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện Dự án
- đảm bảo các hoạt động được triển khai theo đúng kế hoạch hoặc kịp thời điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp


M&E độc lập:

- là các cuộc đánh giá được thực hiện có sự phối hợp và hỗ trợ từ tư vấn thuê ngoài
- ít nhất 3 lần đánh giá độc lập: đánh giá đầu kỳ, đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc
- Báo cáo đánh giá độc lập được gửi cho IFAD, các bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh

Khung logic hay Logframe:

- là một bảng tóm tắt mô tả các cấp độ mục tiêu của Dự án (Mục tiêu dài hạn, mục tiêu cụ thể, kết quả và các hoạt động đầu vào), chỉ số, phương tiện thẩm tra và các giả thuyết quan trọng để Dự án có thể đạt được mục tiêu
- là cơ sở để lập kế hoạch triển khai dự án và giám sát – đánh giá

Mô tả	Các chỉ số thực hiện chính	Cách thức kiểm tra/ đo lường	Giả định và rủi ro
Mục đích			
Mục tiêu			
Kết quả			
Đầu ra			





Đánh giá là quá trình thu thập và phân tích thông tin theo từng thời điểm, phân tích để thấy được mức độ đạt được mục tiêu và tác động mong đợi.

Thời điểm đánh giá:

- Đầu kỳ: cuối năm 2014 (năm đầu tiên dự án được triển khai)
- Giữa kỳ: giữa năm 2017 (trước khi đoàn đánh giá giữa kỳ của IFAD đến làm việc)
- Cuối kỳ: cuối năm 2019 (trước khi đoàn đánh giá kết thúc của IFAD đến làm việc)

- **Phương pháp:**


- Mẫu: 900 hộ trong vùng dự án và **300 hộ đối chứng ngoài vùng dự án ???**
- Bảng hỏi chuẩn của IFAD
- Phần mềm xử lý của IFAD

<http://www.ifad.org/operations/rims/>

- Cán bộ M&E của PCU và cán bộ dự án huyện, xã thực hiện (Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho khảo sát đầu kỳ)
- Các báo cáo đánh giá là tài liệu quan trọng phục vụ các đoàn đánh giá của IFAD

- Thực hiện hàng năm xem xét tác động của các hoạt động dự án ở cấp độ kết quả
- Các nội dung cần đánh giá chuyên đề gồm:
 - Các khoản đầu tư thích ứng biến đổi khí hậu cho giúp tạo ra thu nhập ổn định hoặc cải thiện thu nhập cho các cộng đồng nghèo bị ảnh hưởng;
 - Các mô hình phát triển chuỗi giá trị;
 - Quan hệ đối tác công tư trong xóa đói giảm nghèo;
 - Tác động của tín dụng vi mô cho phụ nữ;
 - Hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể;
 - Tác động của phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trong việc tạo việc làm cho người nghèo;
 - Các tác động giảm nghèo của các hoạt động hỗ trợ thị trường hàng hóa cụ thể
- PCU tự thực hiện và thuê tư vấn

Phương pháp:

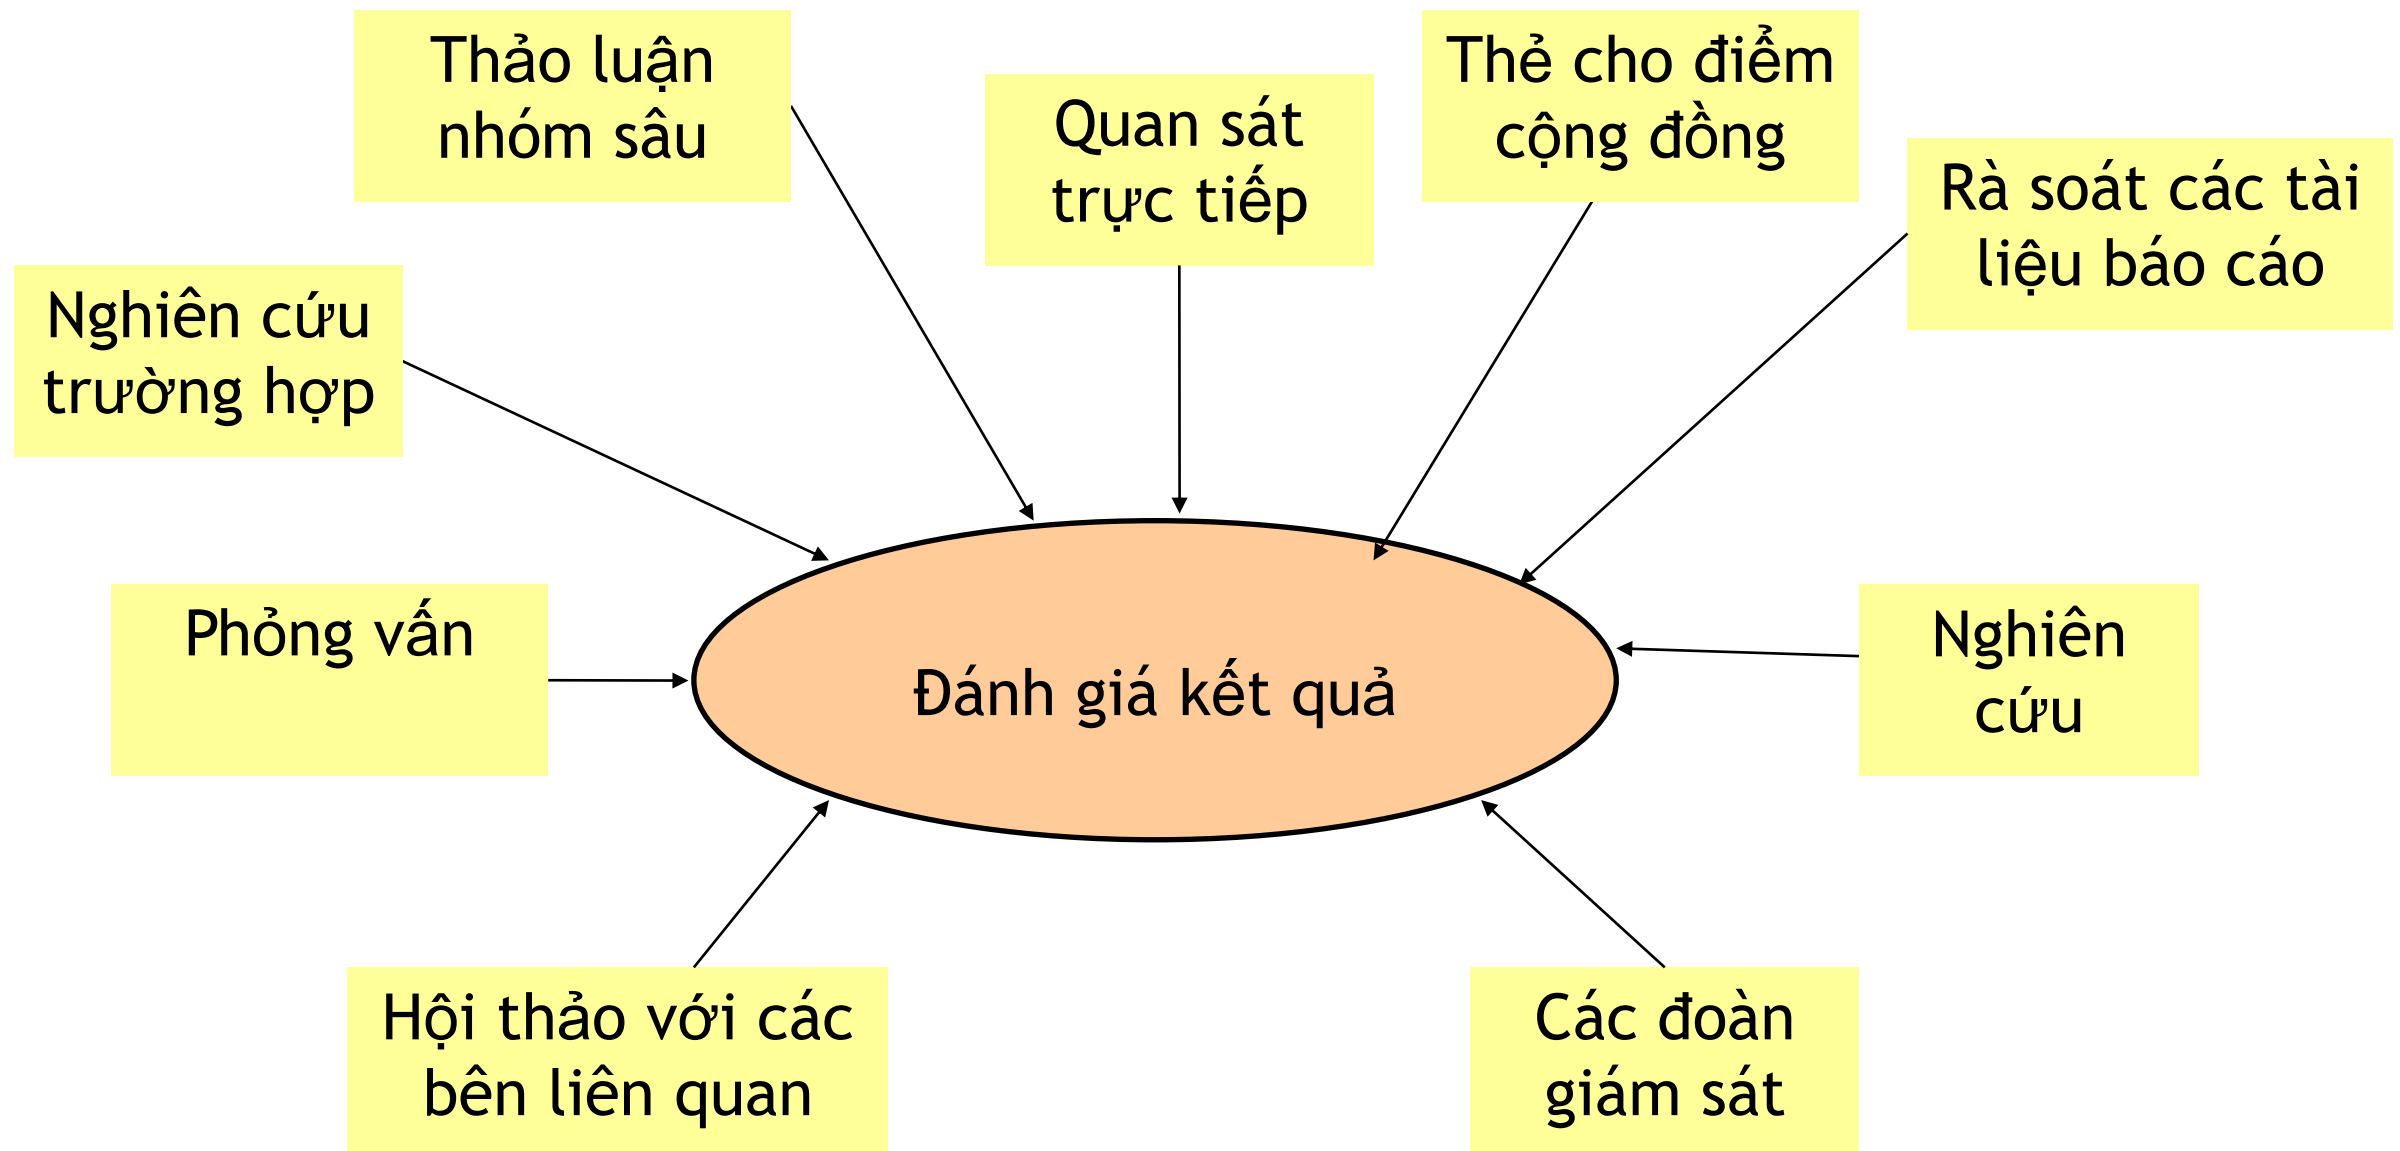

- **Cho IFAD:**
 - Các báo cáo đánh giá (đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ)
 - Báo cáo tiến độ 6 tháng và hàng năm
 - Báo cáo RIMS hàng năm

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn ODA cho Bộ KH&ĐT
(theo Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014)

- ✓ RIMS được xây dựng từ 1 **bảng chuẩn gồm các chỉ số chung** áp dụng cho tất cả các dự án, chương trình của IFAD:
 - Chỉ số cấp 1 (đầu ra - outputs);
 - Chỉ số cấp 2 (kết quả - outcomes);
- ✓ **Dự án chỉ chọn các chỉ số cấp 1 và cấp 2 phù hợp với nội dung của dự án để báo cáo.**
- ✓ RIMS là một bộ phận không thể tách rời của báo cáo tiến độ thường xuyên của dự án.
- ✓ Hạn chót báo cáo RIMS: 31/3 hàng năm

<http://www.ifad.org/operations/rims/handbook/e.pdf>

www.ifad.org/operations/rims/question/e.xls.

Ví dụ về bảng chỉ số RIMS

KẾT QUẢ CẤP 1	KẾT QUẢ CẤP 2
Tài nguyên thiên nhiên (đất và nước)	
1.1.1 Số người được tập huấn về quản lý cơ sở hạ tầng (*)	
1.1.2 Số nhóm quản lý cơ sở hạ tầng được thành lập/củng cố	2.1.1 Khả năng bền vững của nhóm quản lý cơ sở hạ tầng được thành lập/củng cố Số nhóm được vận hành/hoạt động
1.1.3 Thành viên các nhóm quản lý cơ sở hạ tầng (*)	
1.1.4 Số nhóm quản lý cơ sở hạ tầng dưới sự lãnh đạo của phụ nữ	
1.1.5 Diện tích đất tại các công trình thủy lợi được xây dựng/cải tạo	2.1.2 Tính hiệu quả của cơ sở hạ tầng sản xuất - Tỉ lệ % lượng nước cần thiết được cung cấp - Số nông dân có khả năng tiếp cận với nước - Diện tích đất trồng trọt tăng lên
1.1.6 Số điểm lấy nước cho gia súc được xây dựng/cải tạo	
1.1.7 Số hệ thống thu nước mưa được xây dựng/cải tạo	2.1.3 Khả năng bền vững của cơ sở hạ tầng sản xuất - Số công trình hạ tầng được vận hành - Số nông dân tiếp cận an toàn với nguồn nước - Số ngư dân tiếp cận an toàn với đáy nước - Số ao cá hoạt động sau ba năm
1.1.8 Số ao cá được xây dựng/cải tạo	
1.1.9 Số người được tập huấn về quản lý tài nguyên thiên nhiên (*)	


- Các chỉ số trong Khung logic chưa cụ thể; các mục tiêu rất khó đạt được
- Chưa có sự đồng nhất về mặt kỹ thuật liên quan đến các cuộc đánh giá tác động:
 - Mẫu khảo sát: Đối tượng cho 3 đợt khảo sát là như nhau???
 - Nhóm đối chứng???
 - Hai tỉnh đang thuê tư vấn rà soát và hoàn thiện khung logic và hỗ trợ kỹ thuật cho khảo sát đầu kỳ.
- Năng lực và kinh nghiệm của cán bộ dự án (cấp huyện và xã) còn rất hạn chế (đối với Trà Vinh)
 - Tăng cường tập huấn về M&E
 - Tham quan học tập cho cán bộ M&E

**Hệ thống thông tin
quản lý**

Hệ thống GSDG

**Hệ thống quản lý tác
động và kết quả**

**Đo lường và đánh giá
tác động**

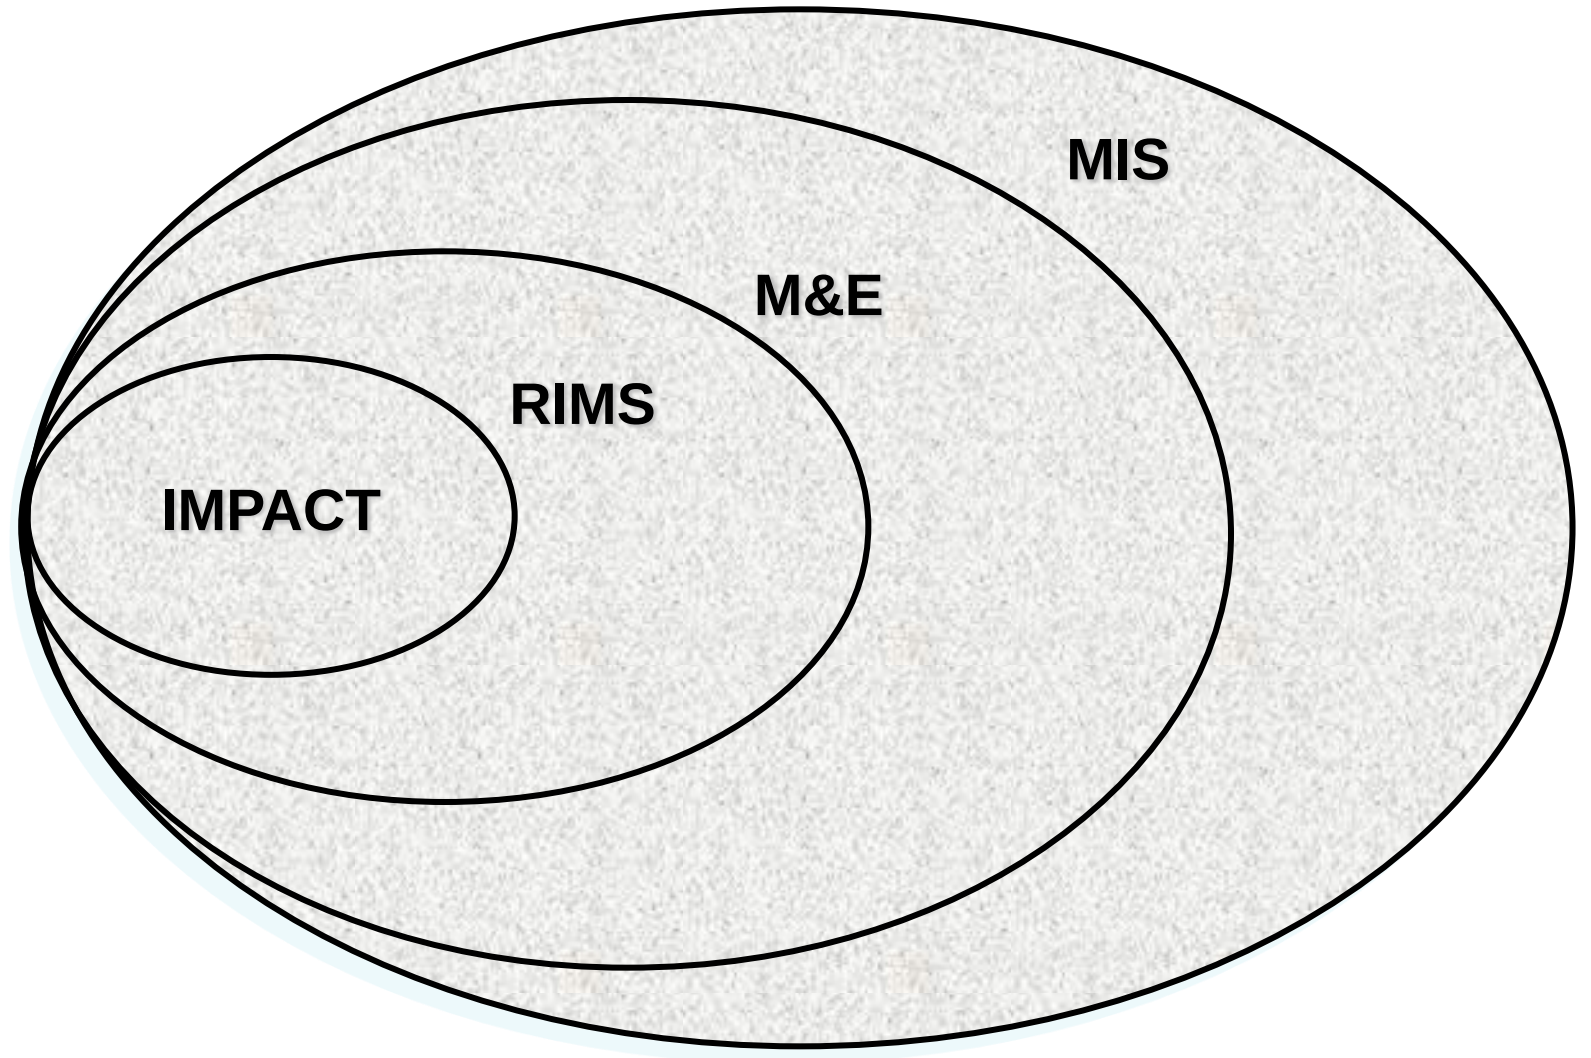

1. *Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án AMD*
2. *Báo cáo thiết kế dự án AMD*
3. *Sổ tay Hướng dẫn về RIMS cấp 1 và cấp 2, 7/2011, IFAD*
4. *Sổ tay Hướng dẫn về RIMS cấp 1 và cấp 2, 4/2014, IFAD*
5. *Hướng dẫn xây dựng hệ thống M&E, IFAD*
6. *Hướng dẫn thực hiện các cuộc khảo sát tác động, 01/2005, IFAD*
7. <http://www.ifad.org>
